1. Grupo3- Administración P&S	 2
1.1 Arquitectura del sistema	 3
1.2 Documentación para usuarios	 . 3
1.3 File lists	 4
1.4 Requerimientos	 4
1.4.1 Requerimientos - Sprint 1	 6
1.4.2 Requerimientos - Sprint 2	 . 13
1.4.3 Requerimientos - Sprint 3	 . 15
1.5 Seguimiento y control	 20
1.5.1 Seguimiento y control - Sprint 1	 21
1.5.1.1 Canvas - Sprint 1	 21
1.5.1.2 Grabaciones - Sprint 1	 21
1.5.1.3 Sprint Retrospective - Sprint 1	 21
1.5.1.4 Sprint Review - Sprint 1	 22
1.5.2 Seguimiento y control - Sprint 2	 22
1.5.2.1 Canvas - Sprint 2	 22
1.5.2.2 Grabaciones - Sprint 2	
1.5.2.3 Sprint Retrospective - Sprint 2	
1.5.2.4 Sprint Review - Sprint 2	 25
1.5.3 Seguimiento y control - Sprint 3	 28
1.5.3.1 Canvas - Sprint 3	
1.5.3.2 Grabaciones - Sprint 3	 28
1.5.3.3 Sprint Retrospective - Sprint 3	
1.5.3.4 Sprint Review - Sprint 3	 29
1.6 Velocidad del Equipo	 29
1.7 Visión del proyecto	
1.7.1 Sprint 0 - VSM	
1.7.2 Sprint 1 - Demo	
1.7.3 Sprint 1 - Retrospectiva	
1.7.4 Sprint 2	
1.7.5 Sprint 3	38

Grupo3- Administración P&S

1. Información del Equipo de Desarrollo

Proyecto	Sistema de gestión P&S							
Grupo	Grupo 3							
Integrantes	Nombre	Rol						
	Michel López	Scrum Master						
	Yamid Ramirez	Desarrollador						
	Adriana Bonilla	Desarrollador						
	Andres Vargas	Desarrollador / Devops						

2. Fechas claves:

Sprint	Inicio	Fin
1	17-09-2018	23-09-2018
2	24-09-2018	30-09-2018
3	1-10-2018	7-10-2018

The team



Scrum Master Equipo 3

Blog stream

Blog stream

Create a blog post to share news and announcements with your team and company.

Create blog post

About us

Recently updated

- Sprint Retrospective Sprint 3
 about 5 hours ago updated
 by Michel Leonardo Lopez v
 iew change
- Requerimientos Sprint 3
 Nov 26, 2018 updated by Mi
 chel Leonardo Lopez view
 change
- Requerimientos Sprint 3
 Nov 19, 2018 updated by A
 driana Bonilla view change
- Sprint 3
 Nov 18, 2018 updated by Jo
 rge Andres Vargas view
 change

	Requerimientos - Sprint 2
	Nov 09, 2018 • updated by A
	driana Bonilla • view change

- Sprint Retrospective Sprint 2 Nov 06, 2018 • updated by A driana Bonilla • view change
- Sprint Retrospective Sprint 2 Nov 06, 2018 • updated by Mi chel Leonardo Lopez • view change
- Sprint Review Sprint 2 Nov 04, 2018 • updated by A driana Bonilla • view change
- Sprint Retrospective Sprint 1 Nov 01, 2018 • updated by A driana Bonilla • view change
- Sprint Review Sprint 1 Oct 30, 2018 • commented by Adriana Bonilla

Arquitectura del sistema

En esta sección se versionaran los artefactos de arquitectura

File	Modified *
Documentación servicios rest.docx	Oct 10, 2018 by Adriana Bonilla
MISO4101-Documento de Arquitectura (7).docx	Oct 13, 2018 by Adriana Bonilla
MISO4101-Documento de Arquitectura_Version3_Sprint2.docx	Oct 30, 2018 by Adriana Bonilla
MISO4101-Documento de Arquitectura_V4_Sprint3.docx	Nov 18, 2018 by Jorge Andres Vargas
Documentación servicios rest_Sprint3.docx	Nov 18, 2018 by Jorge Andres Vargas
Arquitectura Version_Sprint3 Version 5.docx	Nov 19, 2018 by Adriana Bonilla
Documentación servicios rest_Sprint3_V2.docx	Nov 21, 2018 by Yamid Ramirez
Documentación servicios rest_Sprint3_V3.docx	Nov 25, 2018 by Michel Leonardo Lopez
Drag and drop to upload or browse for files	

Documentación para usuarios

En este apartado se llevara el versionamiento de los manuales de usuario

No files shared here yet.

Drag and drop to upload or browse for files

File lists

Create file list

Error rendering macro 'content-report-table': In template Confluence.Templates.User.userLinkUrl: When evaluating "contextPath()": Error while computing function "contextPath()": null

Requerimientos

A continuación se enuncian las historias de usuario del proyecto:

Historia de usuario	Sprint Programado	Descripcion
EQ-65	1	Como coordinador quiero buscar la información de recursos por realizador, asignado y proyecto para hacer seguimiento al desempeño y cumplimiento de los realizadores
EQ-62	1	Como coordinador quiero visualizar todos los proyectos y recursos con su estado para realizar seguimiento y ver su ciclo de vida
EQ-14	1	Como coordinador quiero ver todos los recursos que ya fueron asignados a control de calidad para hacer un seguimiento de los checks de verificación
EQ-12	1	Como coordinador quiero ver la lista de todos los recursos que están pendientes por asignar responsable de gestión de calidad para iniciar la administración de estos y pasarlos a la siguiente fase
EQ-11	1	Como coordinador quiero asignar un responsable a la gestión de calidad para iniciar la fase de cierre de un recurso y tener un responsable que realice la verificación del mismo
EQ-8	1	Como gestor y coordinador quiero poder realizar una búsqueda por fases de los proyectos existentes para conocer su estado actual y hacer seguimiento
EQ-3	1	Como miembro de P&S quiero reasignar las personas que son responsables de un recurso para poder actualizar y tener una contingencia cuando se requiera un mayor esfuerzo.
EQ-2	1	Como miembro de P&S quiero tener integrado el sistema de solicitudes y el sistema de P&S para saber que solicitudes de proyectos existen
EQ-67	2	Como coordinador quiero ver la lista de comentarios que fueron creados en el proceso de gestión de calidad para evaluar si es viable cambiar de fase el recurso
EQ-38	2	Como realizador, diseñador o desarollador web quiero ver el estado de la gestión de calidad de un recurso trabajado y el detalle de su lista de chequeo para hacer seguimiento al recurso en el sistema

EQ-27	2	Como realizador, diseñador o desarollador web quiero ver el detalle de un recurso seleccionado visualizando los recursos intermedios que lo componen para conocer como esta estructurado el recurso final
EQ-25	2	Como realizador, diseñador o desarollador web quiero buscar recursos intermedios y terminados por tipos de producto (video,documentos,bocetos,imagenes,etc) para conocer que recursos existen y se pueden reutilizar
EQ-20	2	Como asesor gestor quiero poder cambiar la fase de un recurso para garantizar su refinamiento en la fase devuelta
EQ-66	3	Como coordinador quiero ver si se completo la lista de chequeo de un recurso para conocer su estado y calidad
EQ-64	3	Como miembro de P&S quiero tener la información del proyecto del sistema de solicitudes disponible en P&S para tener claro el detalle de la solicitud.
EQ-19	3	Como asesor y gestor quiero ver el estado de la gestión de calidad de proyectos y recursos para hacer un segumiento oportuno
EQ-18	3	Como coordinador gestor quiero generar una alerta cuando se ha asignado un responsable a la gestión de calidad para que conozca que tiene una nueva asignación
EQ-7	3	Como coordinador y gestor quiero poder eliminar de una lista de recursos a una persona para tener una administración de los responsables asignados
EQ-5	3	Como miembro de P&S quiero asociar una solicitud a un recurso para establecer el ciclo de vida de un proyecto
EQ-43	Backlog	Como realizador, diseñador o desarollador web quiero realizar copia de seguridad para tener un backup y garantizar el resguardo y disponibilidad de la información
EQ-42	Backlog	Como realizador, diseñador o desarollador web quiero tagear el producto final para contribuir en las búsquedas por medio de filtros haciendo que una búsqueda sea mas acertada
EQ-41	Backlog	Como realizador, diseñador o desarollador web quiero recibir y ver las notificaciones cuando tengo comentarios de calidad para realizar los cambios solicitados a tiempo
EQ-40	Backlog	Como realizador, diseñador o desarollador web quiero cerrar un recurso o un proyecto para terminar el ciclo de vida del mismo en el sistema y hacer un entregable de la solicitud
EQ-39	Backlog	Como realizador, diseñador o desarollador web quiero marcar una fuente como reutilizable para contribuir a la generación de nuevos recursos evitando la duplicidad de fuentes
EQ-37	Backlog	Como realizador, diseñador o desarollador web quiero ver comentarios de la gestión de calidad hecha a un recurso en el que trabaje para intervenir con los cambios que se soliciten y tener conocimiento de la calidad del recurso desarrollado
EQ-36	Backlog	Como realizador, diseñador o desarollador web quiero solicitar que se corra un proceso nocturno para la copia de los archivos que necesito para optimizar tiempos y tener disponible los recursos intermedios cada dia
EQ-34	Backlog	Como realizador, diseñador o desarollador web quiero modificar un recurso final para tener una versión estable que cumpla con los lineamientos de la solicitud realizada
EQ-33	Backlog	Como realizador, diseñador o desarollador web quiero crear un nuevo recurso final integrando con los intermedios para cumplir con la solicitud realizada al sistema de P&S
EQ-32	Backlog	Como realizador, diseñador o desarollador web quiero que la subida y bajada de vídeos sea eficiente sea optima para que la ejecución del proyecto no se extienda
EQ-31	Backlog	Como realizador, diseñador o desarollador web quiero versionar los recursos intermedios para clasificar cual es la versión mas completa
EQ-30	Backlog	Como realizador, diseñador o desarollador web quiero tagear los recursos intermedios para clasificar su contendo
EQ-29	Backlog	Como realizador, diseñador o desarollador web quiero asignar un recurso intermedio a un proyecto para tener claro la evolución y las contribuciones al mismo que ayuden a generar la version del recurso final
EQ-28	Backlog	Como realizador, diseñador o desarollador web quiero subir un nuevo recurso intermedio a la plataforma creando el detalle del mismo para contribuir con el cumplimiento del recurso final
EQ-26	Backlog	Como realizador, diseñador o desarollador web quiero buscar recursos intermedios y recursos terminados filtrandolos por tags para conocer cuales existen y se pueden reutilizar sobre un tema particular
EQ-24	Backlog	Como realizador, diseñador y desarrollador web quiero subir wireframes generados durante el levantamiento de información para llevar un registro de la propuestas realizadas


EQ-23	Backlog	Como realizador, diseñador o desarollador web quiero ver el listado historico y la lista de los recursos actuales en los que ha trabajado con su estado para conocer su trazabilidad en el sistema de P&S
EQ-22	Backlog	Como coordinador, asesor, gestor quiero poder visualizar previamente los recursos intermedios cargados en la plataforma para optimizar tiempos en la ejecución del recurso
EQ-21	Backlog	Como asesor gestor quiero recibir la notificación sobre la gestión de calidad realizada a un recurso para continuar con el proceso de certificación
EQ-17	Backlog	Como responsable de la gestión de calidad quiero generar una notificación cuando se hacen comentarios sobre la revisión del recurso para que el encargado conozca que mejoras se deben realizar
EQ-16	Backlog	Como responsable asignado a la gestión de calidad quiero poder crear comentarios como retroalimentación de la revisión para dejar evidencia de los hallazgos encontrados
EQ-15	Backlog	Como responsable de la gestión de calidad de un recurso quiero diligenciar los checks de verificación para garantizar la calidad de un recurso
EQ-4	Backlog	Como miembro de P&S quiero registrar la información de las reuniones con los clientes y el levantamiento de la información para tener una trazabilidad de las propuestas para crear el recurso

Requerimientos - Sprint 1

ST1 - Historia Usuario 1:

Historia de usuario					Criterios de Aceptación
ID	EQ-2	Nombre	EQ-2		
Puntos de Historia	5	Prioridad	Alta		El usuario conoce la url para crear recursos.
Fecha de Creación	24/ago/18 10:06 PM	Última Modificación	18/sep/18 12:50 PM		El usuario puede acceder a una aplicación donde se demuestra o crear un recurso. El usuario puede crear un recurso desde la aplicación de prueba.
Tipo de Historia	Usuario	Usuario Final	Gestor y Coordin ador		El usuallo puede cieal un recurso desde la aplicación de pide
Narrativa					
Como Gestor y coordinador					
quiero tener una forma de crear recursos desde el sistema de solicitudes					
para que en lo	s dos sistemas la info	rmación este sincro	onizada.		


MOCKUPS



ST1 - Historia Usuario 2:

Historia de usuario				Criterios de Aceptación
ID	EQ-62	Nombre	EQ-62	
Puntos de Historia	5	Prioridad	Media	El usuario ingresa por medio del MENÚ o URL a la sección Recursos > Consultar
Fecha de Creación	24/ago/18 10:06 PM	Última Modificación	18/sep/18 12:50 PM	El sistema despliega la lista de todos los recursos que están creados . El usuario visualiza la información de los recursos (Nombre, proyecto, estado)
Tipo de Historia	Usuario	Usuario Final	Gestor y Coordinador	El usuario puede hacer click sobre un recurso y se muestra el detalle del mismo: Id, Proyecto, Descripción, tipo de recurso y estado El usuario puede visualizar la lista de recursos que están creados paginada.
Narrativa	!			21 usuano puede visuanzan la lista de recuisos que estan orcados paginada.
Como Gesto	or y coordinado	or		
quiero visualizar todos los recursos con su estado				
para realizar seguimiento y ver su ciclo de vida			vida .	

MOCKUPS

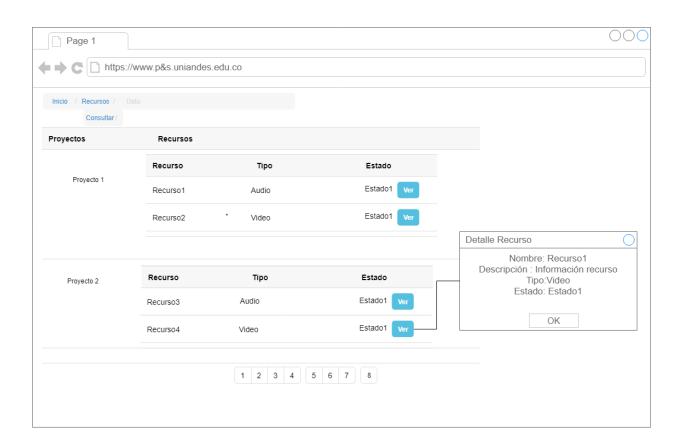

ST1 - Historia Usuario 3:

Historia de usuario				Criterios de Aceptación			
ID	EQ-8	Nombre	EQ-8				
Puntos de Historia	3	Prioridad	Media	El usuario ingresa por medio del MENÚ o URL a la sección Recursos > Consulta por fas Existe una lista desplegable con todas las fases en las que pueden estar los Recursos			
Fecha de Creación	24/ago/18 10:06 PM	Última Modificación	18/sep/18 12:50 PM	 (Preproduccion, Sistematización, Postproducción, Cierre) el usuario puede selecccionar una sola a la vez. Acontinuación se habilita un botón que le permite realizar la consulta El usuario visualiza todos los recursos que están en la fase seleccionada 			
Tipo de Historia	Usuario	Usuario Final	Gestores y coordinadores				


Narrativa				
Como gestor y coordinador				
quiero poder realizar una búsqueda por fases de los recursos existentes				
para conocer su estado actual y hacer sequimiento				
para conocci da cotado actadi y nacei degulimento				

MOCKUPS

Prepro	oduccion	nsultar
▼ ld	▼ Proyecto	▼ Fase Actual
1	Proyecto Universidad para todos	PreProduccion

ST1 - Historia Usuario 4 :

Historia de usuar	io			Criterios de Aceptación
ID	EQ-65	Nombre	EQ-65	
Puntos de Historia	3	Prioridad	Media	Visualizar la lista de proyecto
Fecha de Creación	24/ago/18 10:06 PM	Última Modificación	18/sep/18 12:50 PM	Visualizar lista de nombre de realizadores Permite seleccionar un proyecto y/o realizador
Tipo de Historia	Usuario	Usuario Final	Gestor y coordinador	Permite generar el filtro por datos seleccionados Visualizar todos los recursos de acuerdo al filtro
Narrativa				seleccionado
Como Gestor y co	oordinador			
quiero buscar la ir	nformación de recurso	s por realizador, asig	nado y proyecto	
para hacer seguim	niento al desempeño y	cumplimiento de los	realizadores.	

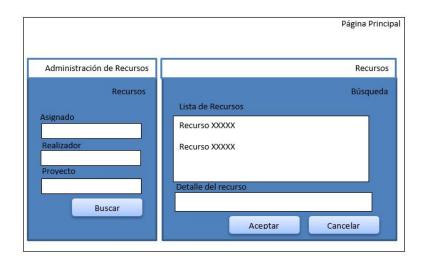

ST1 - Historia Usuario 5 :


Historia de usuari	io		Criterios de Aceptación	
ID	EQ-11	Nombre	EQ-11	
Puntos de Historia	2	Prioridad	Media	El sistema permite visualizar lista de usuarios.
Fecha de Creación	24/ago/18 10:06 PM	Última Modificación	18/sep/18 12:50 PM	Se muestran todos los recursos. Se puede seleccionar un recurso y un único responsa gestión de calidad.
Tipo de Historia	Usuario	Usuario Final	Coordinador	Se asigna un responsable de gestión de calidad.
Narrativa				El estado del recurso se actualiza.
	responsable a la ges de cierre de un recui mo		nsable que realice la	
MOCKUPS				

Mis recursos > enviar a revisión

▼ ld	▼ Recurso	▼ Estado						
1	lmagen plano	Terminado						
2	Formulario Flash	En proceso						
3	Video Presentacion	Asignado						
4	Infograma	Asignado						
5	Set de iconos	Terminado						
Asignar a Seleccione responsable Asignar								


ST1 - Historia Usuario 6 :

	Historia de usuario			Criterios de Aceptacion		
ID	EQ-3	Nombre	EQ-3			
Puntos de Historia	3	Prioridad	Media	El sistema permite visualizar lista de usuarios		
Fecha de Creación	24/ago/18 10:06 PM	Última Modificación	18/sep/18 12:50 PM	Se muestran todos los recursos. Al seleccionar un recurso se visualizan los res		
Tipo de Historia	Usuario	Usuario Final	Gestor y coordinador	asignados Se puede eliminar uno o varios responsables.		
Narrativa				Se puede asignar nuevos responsables al rec		
Como Gestor y c	Como Gestor y coordinador			Los responsables del recurso se actualizan.		
quiero reasignar l	as personas que son	responsables de un	recurso			
para poder actuali esfuerzo.	zar y tener una conti	ngencia cuando se r	equiera un mayor			



ST1 - Historia Usuario 7 :

Historia de us	uario			Criterios de Aceptación
ID	EQ-12	Nombre	EQ-12	
Puntos de Historia	2	Prioridad	Media	El sistema permite visualizar la lista de recursos pendientes por asignar responsable de gestion de calidad.
Fecha de Creación	24/ago/18 10:06 PM	Última Modificación	18/sep/18 12:50 PM	No se visualizan recursos en otros estados.
Tipo de Historia	Usuario	Usuario Final	Gestor y coordinador	
Narrativa				
Como Gestor	y coordinador			
	sta de todos los recurs e gestión de calidad	sos que están pend	lientes por asignar	
	-			
para iniciar la a	administración de esto	is y pasarios a la si	guiente fase	
MOCKUPS				



ST1 - Historia Usuario 8 :

Historia de usuario				Criterios de Aceptación
ID	EQ-14	Nombre	EQ-14	
Puntos de Historia	3	Prioridad	Media	Visualizar lista de recursos asignados a control de calidad
Fecha de Creación	24/ago/18 10:06 PM	Última Modificación	18/sep/18 12:50 PM	Al seleccionar un recurso se puede ver si ya fue calificada con los checks de verificación.
Tipo de Historia	Usuario	Usuario Final	Gestor y coordinador	
Narrativa				
Como Gestor	r y coordinador			
quiero ver tod	dos los recursos que ya	a fueron asignados	a control de	
para hacer un	seguimiento de los ch	ecks de verificació	n	
MOCKUPS				

Mis recursos > para control de calidad

▼ ld	▼ Recurso	▼
1	lmagen plano	0
2	Formulario Flash	0
3	Video Presentacion	0
4	Infograma	0
5	Set de iconos	0

Iniciar revision

Requerimientos - Sprint 2

ST2 - Historia Usuario 1:

Historia de	usuario			Criterios de Aceptación
ID	EQ-62	Nombre	EQ-62	
Puntos de Historia	5	Prioridad	Media	El usuario ingresa por medio del MENÚ o URL a la sección Recursos > Consultar
Fecha de Creación	24/ago/18 10:06 PM	Última Modificación	18/sep/18 12:50 PM	El sistema despliega la lista de todos los recursos que están creados . El usuario visualiza la información de los recursos (Nombre, proyecto, estado)
Tipo de Historia	Usuario	Usuario Final	Gestor y Coordinador	El usuario puede hacer click sobre un recurso y se muestra el detalle del mismo: le Proyecto, Descripción, tipo de recurso y estado El usuario puede visualizar la lista de recursos que están creados paginada.
Narrativa				Li doddino passes violadinzari la rista do resursos que estari sistados paginidad.
Como Gesto	or y coordinado	or		
quiero visualizar todos los recursos con su estado				
para realizar seguimiento y ver su ciclo de vida				

MOCKUPS

ST2 - Historia Usuario 2:

Historia de usuario				Criterios de Aceptación
ID	EQ-14	Nombre	EQ-14	
Puntos de Historia	3	Prioridad	Media	Visualizar lista de recursos asignados a control de calidad

Fecha de Creación	24/ago/18 10:06 PM	Última Modificación	18/sep/18 12:50 PM	checks de verificació	si ya iue caiiica	da con los
Tipo de Historia	Usuario	Usuario Final	Gestor y coordinador			
Narrativa						
Como Gestor	y coordinador					
quiero ver todo calidad	os los recursos que ya	a fueron asignados	a control de			
para hacer un	seguimiento de los ch	ecks de verificació	n			
MOCKLIPS						

ST1 - Historia Usuario 3 :

Historia de usuar	io			Criterios de Aceptacion
ID	EQ-3	Nombre	EQ-3	
Puntos de Historia	3	Prioridad	Media	El sistema permite visualizar lista de usuarios.
Fecha de Creación	24/ago/18 10:06 PM	Última Modificación	18/sep/18 12:50 PM	Se muestran todos los recursos. Al seleccionar un recurso se visualizan los responsables
Tipo de Historia	Usuario	Usuario Final	Gestor y coordinador	asignados Se puede eliminar uno o varios responsables.
Narrativa				Se puede asignar nuevos responsables al recurso
Como Gestor y co	oordinador			Los responsables del recurso se actualizan.
quiero reasignar la	as personas que son	responsables de un	recurso	
para poder actualiz esfuerzo.	zar y tener una contii	ngencia cuando se re	quiera un mayor	
MOCKUPS				

Historia de usuario			Criterios de Done	
ID	EQ-67	Nombre	EQ-67	
Puntos de Historia	3	Prioridad	Medio	Visualizar lista de recursos que tienen asignados comentarios.

Fecha de Creación	13/ago/18 10:06 PM	Última Modificación	18/sep/18 12:50 PM	Seleccionar un recurso especifico. Mostrar comentarios asignados.
Tipo de Historia	Usuario	Usuario Final	Coordinador	Ver nombre del responsable que escribió el comenta
Narrativa				
Como coordinador				
quiero ver la lista d calidad	de comentarios que fu	eron creados en el pr	oceso de gestión de	
para evaluar si es	viable cambiar de fase	e el recurso		

MOCKUPS




Requerimientos - Sprint 3

ST2 - Historia Usuario 10:

Historia de usuario Criterios de Done

ID	EQ-11	Nombre	EQ-11		
Puntos de Historia	3	Prioridad	Medio		Visualizar lista de recursos en estado de gestión de calidad.
Fecha de Creación	22/ago/18 10:06 PM	Última Modificación	19/sep/18 12:50 PM		Seleccionar un responsable de gestión de calidad. Actualizar responsable de gestión de calidad
Tipo de Historia	Usuario	Usuario Final	Realizador, diseñador o desarollador web		/ Notae Pospor near to de good of de canada
Narrativa					
Como coordinador					
quiero asignar un responsable a la gestión de calidad					
para iniciar la fase de cierre de un recurso y tener un responsable que realice la verificación del mismo					

MOCKUPS

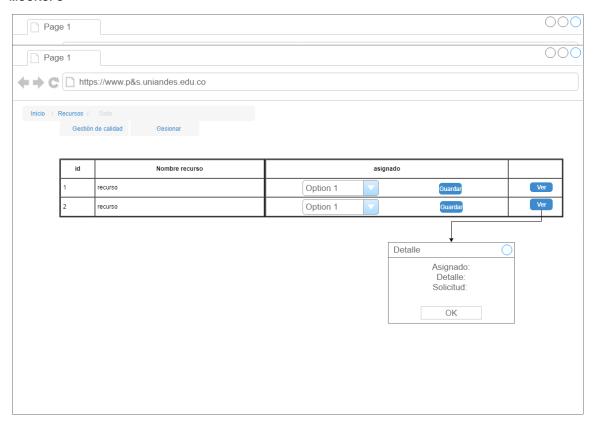


ST2 - Historia Usuario 11 :

Historia de usuario					Criterios de Done	
ID	EQ-12	Nombre	EQ-27			
Puntos de Historia	2	Prioridad	Medio		Ver en el landing una opción para gestionar los recursos en estado de gestion de calidad	
Fecha de Creación	18/ago/18 10:06 PM	Última Modificación	19/sep/18 12:50 PM		Visualizar lista de recursos en estado de gestión de calidad Ver detalle del recurso en la tabla principal	
Tipo de Historia	Usuario	Usuario Final	Realizador, diseñador o desarollador web	Ver botón para ver detalles co	Ver detaile del recurso en la tabla principal Ver botón para ver detalles como el responsable de realizar el recurso	
Narrativa				Mostrar lista de responsables para asignar o actualizar revisor.		
Como coordinador						

quiero ver la lista de todos los recursos que están pendientes por asignar responsable de gestión de calidad para iniciar la administración de estos y pasarlos a la siguiente fase


MOCKUPS

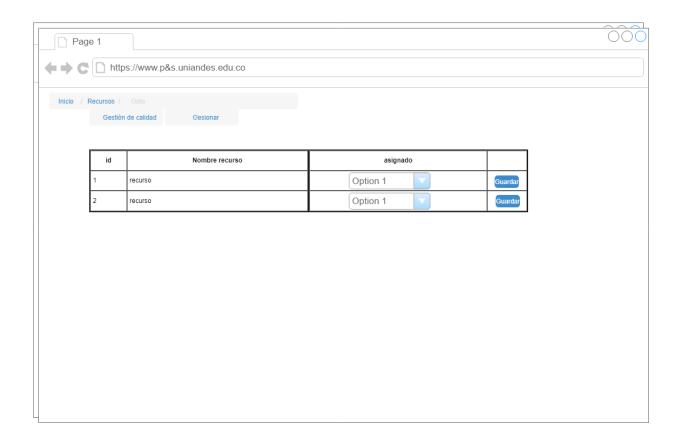


ST2 - Historia Usuario 12 :


Historia de u	suario			Criterios de Done
ID	EQ-14	Nombre	EQ-25	
Puntos de Historia	3	Prioridad	Medio	Visualizar lista de recursos asignados a control de calidad
Fecha de Creación	18/ago/18 10:06 PM	Última Modificación	19/sep/18 12:50 PM	Al seleccionar un recurso se puede ver si ya fue calificada con los checks de verificación.
Tipo de Historia	Usuario	Usuario Final	Realizador, diseñador o desarollador web	
Narrativa				
Como gestor	y coordinador			
quiero ver todos los recursos que ya fueron asignados a control de calidad				
para hacer un seguimiento de los checks de verificación			icación	

MOCKUPS

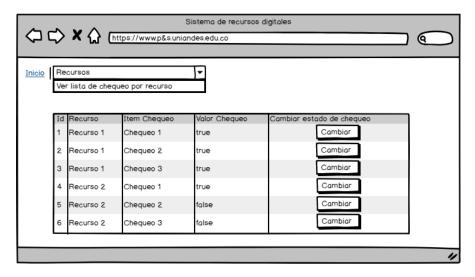

ST2 - Historia Usuario 13:






ST3 - Historia Usuario 14:

Historia de usuario	Criterios de Done
---------------------	-------------------

ID	EQ-16	Nombre	EQ-66				
Puntos de Historia	5	Prioridad	Medio				
Fecha de Creación	13/ago/18 10:06 PM	Última Modificación	18/sep/18 12:50 PM				
Tipo de Historia Usuario Usuario Final Coordinador							
Narrativa							
Como responsable asignado a la gestión de calidad							
quiero poder crear comentarios como retroalimentación de la revisión							
para dejar evidencia	de los hallazgos encont	trados					


MOCKUPS



ST2 - Historia Usuario 15:

Historia de usuario					Criterios de Done
ID	EQ-27	Nombre	EQ-27		
Puntos de Historia 5 Prioridad Medio				Visualizar lista de recursos intermedios de un recurso	
Fecha de Creación	a de Creación 22/ago/18 10:06 PM Última Modificación 19/sep/18 12:50 PM			principal.	
Tipo de Historia	Usuario	Usuario Final	Miembro de P&S		
Narrativa					
Como realizador, dise	eñador o desarollador w	eb			
quiero ver el detalle de un recurso seleccionado visualizando los recursos intermedios que					
lo componen					
para conocer como e	sta estructurado el recu	rso final.			


MOCKUPS

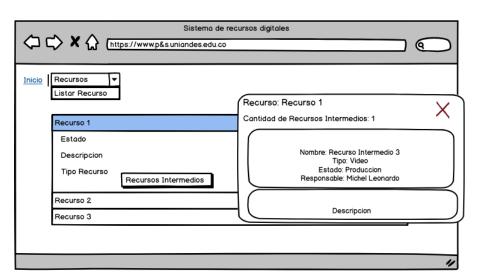

ST2 - Historia Usuario 16:

Historia de usuario		Criterios de Done		
ID	EQ-03	Nombre	EQ-03	
Puntos de Historia	5	Prioridad	Medio	Visualizar lista de recursos y sus
Fecha de Creación	22/ago/18 10:06 PM	Última Modificación	19/sep/18 12:50 PM	responsables asignados.
Tipo de Historia	Usuario	Usuario Final Miembro de P&S	Tener la posibilidad de seleccionar un responsable para asignar.	
Narrativa		Botón para acción de reasignar		
	dor quiero reasignar las pers ontingencia cuando se requie	de un recurso para poder		

MOCKUPS

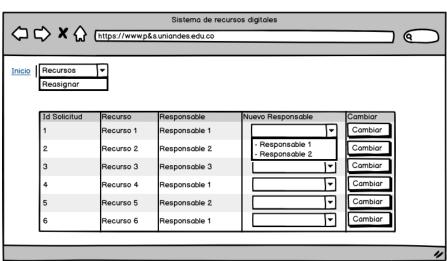

Seguimiento y control

Control por cada sprint

Seguimiento y control - Sprint 1

Canvas - Sprint 1

File	Modified *
No files shared here yet.	
Drag and drop to upload or browse for files	

Grabaciones - Sprint 1

File	Modified *
daily_semana1_1.mp3	Sep 28, 2018 by Adriana Bonilla
daily_semana1_2.mpeg	Oct 02, 2018 by Adriana Bonilla
daily_semana2_1.mp3	Oct 08, 2018 by Adriana Bonilla
daily_semana2_2.mp3	Oct 13, 2018 by Adriana Bonilla
daily_semana3_1.mpeg	Oct 13, 2018 by Adriana Bonilla
daily_semana3_2.mp3	Oct 20, 2018 by Adriana Bonilla
Drag and drop to upload or brows	se for files

Sprint Retrospective - Sprint 1

Compromisos

Reuniòn para trabajar en equipo y lograr que la curva de aprendizaje y el definition of ready estèn bien.

Compromiso del equipo para respetar los horarios y el tiempo destinado al proyecto.

Estar mas pendiente y comprometido con las entregas

Acciones

Reuniòn el dìa domingo 14 de octubre para poner a punto los proyectos en las diferentes màquinas.

Reuniòn de lunes a viernes de 12m a 1pm.

En caso de faltar o llegar tarde sin explicación se agregaràn puntos negativos. Al final del sprint, el que tenga màs puntos negativos invita a los demàs a almorzar.

Estimados por persona

Yamid Ramirez: 10 horas por h.u. Andres Vargas: 14 horas por h.u. Michel Lopez: 14 Horas por h.u. Adriana Bonilla: 14 horas hu

Burndown chart

Sprint Review - Sprint 1

Seguimiento y control - Sprint 2

Canvas - Sprint 2

No files shared here yet.

Drag and drop to upload or browse for files

Grabaciones - Sprint 2

File	Modified *
daily_semana1_1.mp3	Oct 24, 2018 by Adriana Bonilla
> sprint2_daily2.mpeg	Nov 01, 2018 by Adriana Bonilla
> sprint2_daily3.mpeg	Nov 01, 2018 by Adriana Bonilla
> print2-daily.mpeg	Nov 04, 2018 by Adriana Bonilla
> sprint2-cierre.mpeg	Nov 04, 2018 by Adriana Bonilla

Drag and drop to upload or browse for files

Sprint Retrospective - Sprint 2

Retrospectiva

Focalizar

Indagar (Yamid y Adriana)	Antes que apoyar (Andrés y Michel)
Dialogo (Yamid, Adriana, Andres, Michel)	Antes que debate
Conversación (Andres y Michel)	Antes que argumentación (Yamid y Adriana)
Entender (Yamid, Adriana, Andres Michel)	Antes que defender

2. Generación de ideas:

ADRIANA

- 1. Compromiso (Yo debo ser el que tenga que ser, para cumplir y culminar mis actividades completamente, Comentario de Michel).
- 2. Responsabilidad (yo debo ser responsable con las tareas asignadas y dejar de depender o esperar que nuestra compañera Adriana resuelva todo. Comentario de Michel).
- 3. Preocuparse por las contribuciones para el proyecto (De acuerdo, ya que se no se presentan en ocasiones avances teniendo las fechas claras y definidas. Comentario de Yamid)

ANDRES

1. COMPROMISOS REALES:

Esta es una idea que aparece en todas las reuniones del equipo, desde el primer ejercicio del curso de la Galeria y no mejora, realmente no hay compromiso.(Adriana).

Estoy de acuerdo con mi falta de compromiso y hay que dejar las excusas. (Michel).

2. MANEJO ADECUADO DE LA PLANEACIÓN FRENTE A LO REGISTRADO

- -Sin compromiso es claro que la planeación no se registrara correctamente, creo que todo se basa en lo mismo(Adriana).
- Falta de comunicación, compartir, debatir, decir la verdad. Aplicar con honestidad las preguntas del Daily (El grupo debe saber la situación real de la historia, saber qué problemas se han presentado y si necesita ayuda. Yamid).
- -De acuerdo la comunicación es crucial, para poder llevar a cabo la planeación y una buena ejecución.(Adriana)
- -Independiente de las capacidades de cada uno de los integrantes del equipo, se da por hecho que todos cumpliremos con nuestra actividad, dejando para lo último los problemas que realmente tenemos y no comunicarlos a tiempo ya que genera incumplimientos y retrasos. (Michel).

YAMID

1. Ser mas comprometidos

-Igual que el del otro compañero sobre compromiso (Adriana)

2. Preguntar sin miedo o consultar con los compañeros cuando haya algún lio

-Esto es importante, y estoy de acuerdo, pero es claro que si no se contribuye, si no hay compromiso con el proyecto no hay preguntas claras para avanzar en el trabajo, si todos trabajan hacia el mismo objetivo puede existir un apoyo (Adriana)

3. Sacar tiempo para las obligaciones adquiridas con la universidad

- -(Me parece que es un comentario que debe tener algo más puntual, ya que dejar el hecho de sacar el tiempo a cada uno, es algo poco estratégico . Comentario por Andres)
- -Todo apunta a lo mismo compromiso y responsabilidad, creo que falta más interés en avanzar en la materia y el proyecto (Adriana)

MICHEL

1. Compromisos reales

-El mismo caso de los compañeros, el mismo comentario (Adriana)

2. Organización propia para que al trabajar en grupo se aporte efectivamente

- -Estructurar mejor las responsabilidades adquiridas para ayudar al equipo a avanzar efectivamente (Adriana)
- -Estar comunicados constantemente para resolver realmente los problemas y apoyarnos para sacar el proyecto adelante (Una de las

cosas más importantes en el equipo es la comunicación, sin ella es complicado lograr aplicar los demás compromisos. Comentario por Andres) (A pesar de tener el whatsapp, no nos comentamos ni los avances ni los problemas que tenemos. Yamid)
-La comunicación permite que el proyecto avance correctamente, pero cuando es una comunicación asertiva y de interés por todos. Cuando todo el equipo se interesa por avanzar hacia el mismo objetivo (Adriana)

3. A trabajar en el siguiente Sprint:

1- Compromiso

Entregas semanales, seguimiento de lo comprometido.


2- Comunicacion

Dailys establecidos los: Miercoles- Medio dia Sabado .8 PM

3- Responsabilidad:

No usar mas excusas de desconocimiento técnico, mostrar avances significativos sobre el proyecto, mencionar en el daily problemas específicos sobre la HU.

RESULTADOS: SPRINT 2 BURNDOWN CHART



Informe de estado

Incidencias terminadas

Clave	Resumen	Tipo de Incidencia	Prioridad	Estado	Puntos de Historia (8)
EQ-62	Como Gestor y coordinador quiero visualizar todos los recursos con su estado para realizar seguimiento y ver su ciclo de vida	Historia	Medium	LISTO	5
EQ-67	Como coordinador quiero ver la lista de comentarios que fueron creados en el proceso de gestión de calidad para evaluar si es viable cambiar de fase el recurso	Historia	Medium	LISTO	3
EQ-121	Como usuario quiero tener un mejor diseño de la aplicación para tener una mejor experiencia de usuario	Error	Medium	LISTO	-

Ver en el navegador de incidencias

Incidencias Sin Completar

Clave	Resumen	Tipo de Incidencia	Prioridad	Estado	Puntos de Historia (5)
-------	---------	-----------------------	-----------	--------	---------------------------------

EQ-3	Como gestor y coordinador quiero reasignar las personas que son responsables de un recurso para poder actualizar y tener una contingencia cuando se requiera un mayor esfuerzo.	Historia	Medium	EN PROGRESO	2
EQ-14	Como gestor y coordinador quiero ver todos los recursos que ya fueron asignados a control de calidad para hacer un seguimiento de los checks de verificación	Historia	Medium	EN PROGRESO	3

Sprint Review - Sprint 2


DEMO:

URL: https://resource-admin-conectate-front.herokuapp.com/


Cambio interfaz gráfica (Defecto)

1. Landing


Creación de recursos- Modificación de interfaz




Búsqueda de Fases:



2. HU 67 Ver comentarios por recursos que se encuentran en gestión de calidad:

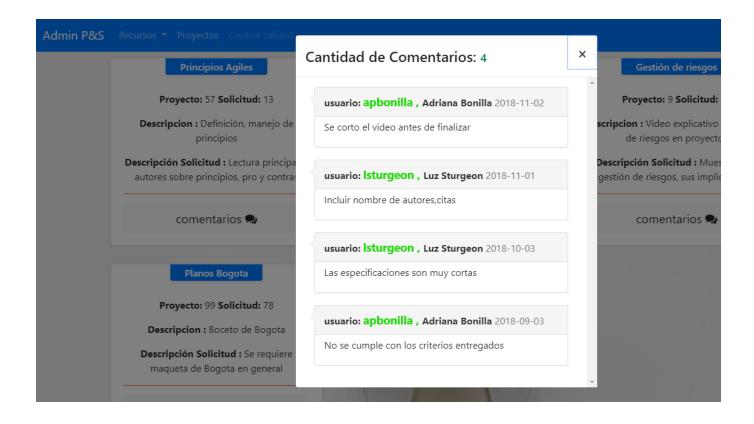





Seguimiento y control - Sprint 3

Canvas - Sprint 3

No files shared here yet.

Drag and drop to upload or browse for files

Grabaciones - Sprint 3

File	Modified *
daily1.mpeg	Nov 13, 2018 by Adriana Bonilla
daily2.mpeg	Nov 13, 2018 by Adriana Bonilla
daily3.mpeg	Nov 19, 2018 by Adriana Bonilla
daily4.mpeg	Nov 19, 2018 by Adriana Bonilla
daily5.mpeg	Nov 23, 2018 by Adriana Bonilla
Drag and drop to upload or browse for files	

Sprint Retrospective - Sprint 3

Sprint Review - Sprint 3

Velocidad del Equipo

VSM -

GUIDEMAR	o							
Coordinador de Gestión		Coordinador de Control de calidad	Asesores y gest Control de calidad	Realizadores,Di Gestión	Realizadores,Di Preproducción	Realizadores,Di Producción	Realizadores,Di PostProducción	Realizadores,Di F Gestión de calidad c
Integracion P&S con el sistema de solicitudes	Administracion de proyectos	Gestión de calidad	Gestion de calidad	Administración de los recursos asignados	Levantamiento de información	Gestión de recurso Intermedios	Edición	Seguimiento control de calidad
Release1								
EQ-2 Realizar consumo de servicio para integrar con siste	EQ-62 Ver lista de proyectos y recursos con su estado	EQ-11 Asignar un responsable a la gestión de calidad						
	EQ-8 Realizar filtro de proyectos por fase en la que se	EQ-3 Reasignar las personas que trabajan en un recurso						
	EQ-65 Realizar filtro de recursos por realizador asignado	EQ-12 Ver lista de recursos listos para gestión de calidad pendiente						
		EQ-14 Ver recursos ya asignados a gestión de calida						
Release 2								
	EQ-20Permitir cambiar las fases de un recurso	EQ-67 Ver traza de comentarios de la gestión de calidad	EQ-20 Cambiar fase de un recurso	EQ-25 Buscar recursos intermedios y terminados por ti				EQ-38 Ver estado de la revisión de calidad de un recurso
Realese 3				EQ-27 Ver el detalle de un recurso selecionado ver I				
EQ-5 Asociar la solicitud a un nuevo recurso	EQ-7 Eliminar personas que trabajan en un recurso	EQ-66 Ver si se completo la lista de chequeo	EQ-19 Ver el estado de la Gestión de calidad de proyec					
EQ-64 Migrar la información del proyecto del sistema de solicit		EQ-18 Generar alerta de asignación control de calidad						
Unscheduled								
	Ver lista de recursos y estado por proyecto		Recibir notificación sobre el resultado de la revisión de calida	Buscar recursos intermedios y terminados por tags	Registrar información de las reuniones con los clientes . Info	Subir un nuevo recurso intermedio	Crear un recurso con los intermedios	Ver comentarios de la revisión de calidad de un recurso r
	Visualizar el estado de todos los recursos			Ver listado histórico de recursos a los que ha sido asign	Subir wireframes creados de las propuestas	Crear detalle al recurso intermedio	Modificar un recurso, actualizar	Ver lista de chequeo de control de calidad de un recurso
	Permitir visualizacion previa de los archivos cargado			Ver lista de recursos a los que se está asignado		Asociar a un proyecto y a un recurso	Permitir versionar un recurso	Recibir (Control control de calidad de los control control de calidad de los control control de calidad de los control
				Ver estado de los recursos a los que se está asignado		Asignar tags al recurso intermedio	Generar un proceso nocturno de copia de archivos	Ver notificación de control de calidad
				Acceder a toda la información del recurso		Versionar los recursos intermedios		
				Visualizar recursos intermedios		Optimizar subida y bajada de videos		

VELOCIDAD VERSION 1:

Detalle de Velo	cidad del Sprint		Detalle de Veloc	idad del Sprint		Detalle de Veloc	idad del Sprint	
Sprint	1		Sprint	2		Sprint	3	
Nº Horas por Semana	8		Nº Horas por Semana	8		Nº Horas por Semana	8	
Nº Semanas	3		Nº Semanas	3		Nº Semanas	3	
Nº de Desarrolladores	4		Nº de Desarrolladores	4		Nº de Desarrolladores	4	
Total Horas Asignas para el Sprint	96		Total Horas Asignas para el Sprint	96		Total Horas Asignas para el Sprint	96	
Velocidad del Sprint	21		Velocidad del Sprint	21		Velocidad del Sprint	21	
Historia de Usua	rio Base		Historia de Usua	rio Base		Historia de Usua	rio Base	
ID	EQ-20		ID	EQ-20		ID	EQ-20	
Titulo	Cambiar fases de un recurso	0	Titulo	Cambiar fases de un recurso		Titulo	Cambiar fases de	un recurso
Narrativa	tiva Como asesor gestor quiero poder cambiar la fase de un recurso para garantizar su refinamiento en la fase devuelta		Narrativa	Como asesor gestor quiero poder cambiar la fase de un recurso para garantizar su refinamiento en la fase devuelta		Narrativa	Como asesor ges poder cambiar la recurso para gara refinamiento en la devuelta	fase de un antizar su
Puntos de Historia de Usuario	2		Puntos de Historia de Usuario	2	Puntos de Historia de Usuario		2	
Sumatoria de Horas	9		Sumatoria de Horas	9		Sumatoria de Horas		
Actividades			Actividades		Actividades			
ID	Descripción	Estimación de Horas	ID	Descripción	Estimación de Horas	ID	Descripción	Estimación de Horas
1	Crear html con la listas de recursos permitidos para hacer cambio de fase	1	1	Crear html con la listas de recursos permitidos para hacer cambio de fase	1	1	Crear html con la listas de recursos permitidos para hacer cambio de fase	1
2	Crear un servicio REST de actualización de fase	2	2	Crear un servicio REST de actualización de fase	2	2	Crear un servicio REST de actualización de fase	2
3	Modelo de datos para actualización de recurso con nueva fase	1	3	Modelo de datos para actualización de recurso con nueva fase	1	3	Modelo de datos para actualización de recurso con nueva fase	1
4	Integración del servicio el modelo y el formulario	1	4	Integración del servicio el 1 modelo y el formulario		4	Integración del servicio el modelo y el formulario	1
5	Pruebas unitarias y de desarrollador	2	5	Pruebas unitarias y de desarrollador	2	5	Pruebas unitarias y de desarrollador	2
6	Analisis del requerimiento, leer historia, chequear mockups	1	6	Analisis del requerimiento, leer historia, chequear mockups	1	6	Analisis del requerimiento, leer historia, chequear mockups	1

7	Gestión de versionamiento de código y despliegue	1	7	Gestión de versionamiento de código y despliegue	1	7	Gestión de versionamiento de código y despliegue	1
8			8			8		
9			9			9		
10			10			10		

VELOCIDAD VERSION 2 - SPRINT 2

			Detalle de Veloc	idad del Sprint		Detalle de Veloci	idad del Sprint	
Detalle de Velo	cidad del Sprint							
Sprint	1		Sprint	2		Sprint	3	
Nº Horas por Semana	8		Nº Horas por Semana	8		Nº Horas por Semana	8	
Nº Semanas	3		Nº Semanas	3		Nº Semanas	3	
Nº de Desarrolladores	4		Nº de Desarrolladores	4		Nº de Desarrolladores	4	
Total Horas Asignas para el Sprint	96		Total Horas Asignas para el Sprint	96		Total Horas Asignas para el Sprint	96	
Velocidad del Sprint	21		Velocidad del Sprint	15		Velocidad del Sprint	15	
Historia de Usua	rio Base		Historia de Usua	ırio Base		Historia de Usua	rio Base	
ID	EQ-20		ID	EQ-20		ID	EQ-20	
Titulo	Cambiar fases de un recurso)	Titulo	Cambiar fases de un recurso		Titulo	Cambiar fases de	e un recurso
Narrativa	Como asesor gestor quiero poder cambiar la fase de un recurso para garantizar su refinamiento en la fase devuelta		Narrativa	Como asesor gestor quiero poder cambiar la fase de un recurso para garantizar su refinamiento en la fase devuelta		Narrativa	Como asesor ge poder cambiar la recurso para gar refinamiento en l devuelta	fase de un antizar su
Puntos de Historia de Usuario	5		Puntos de Historia de Usuario	5		Puntos de Historia de Usuario		
Sumatoria de Horas	9		Sumatoria de Horas	31		Sumatoria de Horas	31	
Actividades			Actividades			Actividades		
ID	Descripción	Estimación de Horas	ID	Descripción	Estimación de Horas	ID	Descripción	Estimación de Horas
1	Crear html con la listas de recursos permitidos para hacer cambio de fase	1	1	Crear HTML lista de recursos, integrar con fases	4	1	Crear HTML lista de recursos, integrar con fases	4
2	Crear un servicio REST de actualización de fase	2	2	Crear un servicio REST de actualización de fase	2	2	Crear un servicio REST de actualización de fase	2
3	Modelo de datos para actualización de recurso con nueva fase	1	3	Consumir recurso lista de recursos incluyendo fase actual	2	3	Consumir recurso lista de recursos incluyendo fase actual	2
4	Integración del servicio el modelo y el formulario	1	4	Modificar modelo de datos	2	4	Modificar modelo de datos	2
5	Pruebas unitarias y de desarrollador	2	5	Crear servicio REST actualizar recurso	4	5	Crear servicio REST actualizar recurso	4
6	Analisis del requerimiento, leer historia, chequear mockups	1	6	Pruebas unitarias	2	6	Pruebas unitarias	2


7	Gestión de versionamiento de código y despliegue	1	7	Analisis de requerimientos	1	7	Analisis de requerimientos	1
			8	Crear pantalla listar fases	3	8	Crear pantalla listar fases	3
			9	Integracion y despliegue	3	9	Integracion y despliegue	3
			10	Consumir recurso de actualizacion de fase	3	10	Consumir recurso de actualizacion de fase	3
			11	Crear pantalla de confirmacion de actualizacion, manejo de errores	3	11	Crear pantalla de confirmacion de actualizacion, manejo de errores	3
			12	Integrar en landing y en el menu nueva funcionalidad	2	12	Integrar en landing y en el menu nueva funcionalidad	2

Visión del proyecto
Sprint 0 - VSM

GUIDEMAI	Р							
Coordinador de Gestión		Coordinador de Control de calidad	Asesores y gest Control de calidad	Realizadores,Di Gestión	Realizadores,Di Preproducción	Realizadores,Di Producción	Realizadores,Di PostProducción	Realizadores,Di Gestión de calidad
Integracion P&S con el sistema de solicitudes	Administracion de proyectos	Gestión de calidad	Gestion de calidad	Administración de los recursos asignados	Levantamiento de información	Gestión de recurso Intermedios	Edición	Seguimiento control de calidad
Release1								
EQ-2 Realizar consumo de servicio para integrar con siste	EQ-62 Ver lista de proyectos y recursos con su estado	EQ-11 Asignar un responsable a la gestión de calidad						
	EQ-8 Realizar filtro de proyectos por fase en la que se	EQ-3 Reasignar las personas que trabajan en un recurso						
	EQ-65 Realizar filtro de recursos por realizador asignado	EQ-12 Ver lista de recursos listos para gestión de calidad pendiente						
		EQ-14 Ver recursos ya asignados a gestión de calida						
Release 2								
	EQ-20Permitir cambiar las fases de un recurso	EQ-67 Ver traza de comentarios de la gestión de calidad	EQ-20 Cambiar fase de un recurso	EQ-25 Buscar recursos intermedios y terminados por ti				EQ-38 Ver estado de la revisión de calidad de un recurso
Realese 3				EQ-27 Ver el detalle de un recurso selecionado ver l				
EQ-5 Asociar la solicitud a un nuevo recurso	EQ-7 Eliminar personas que trabajan en un recurso	EQ-66 Ver si se completo la lista de chequeo	EQ-19 Ver el estado de la Gestión de calidad de proyec					
EQ-64 Migrar la información del proyecto del sistema de solicit		EQ-18 Generar alerta de asignación control de calidad						
Unscheduled								
	Ver lista de recursos y estado por proyecto		Recibir notificación sobre el resultado de la revisión de calida	Buscar recursos intermedios y terminados por tags	Registrar información de las reuniones con los clientes . Info	Subir un nuevo recurso intermedio	Crear un recurso con los intermedios	Ver comentarios de la revisión de calidad de un recurso
	Visualizar el estado de todos los recursos			Ver listado histórico de recursos a los que ha sido asign	Subir wireframes creados de las propuestas	Crear detalle al recurso intermedio	Modificar un recurso, actualizar	Ver lista de chequeo de control de calidad de un recurso
	Permitir visualizacion previa de los archivos cargado			Ver lista de recursos a los que se está asignado		Asociar a un proyecto y a un recurso	Permitir versionar un recurso	Recibir notificaciones sobre el control de calidad de los
				Ver estado de los recursos a los que se está asignado		Asignar tags al recurso intermedio	Generar un proceso nocturno de copia de archivos	Ver notificación de control de calidad
				Acceder a toda la información del recurso		Versionar los recursos intermedios		
				Visualizar recursos intermedios		Optimizar subida y bajada de videos		

Sprint 1 - Demo


https://resource-admin-conectate-front.herokuapp.com/




Menu



Crear : Es para probar el servicios que se dispondrá para crear recursos:




Fases: Muestra los recursos que están en la fase seleccionada



Sprint 1 - Retrospectiva

Actividad de retrospectiva

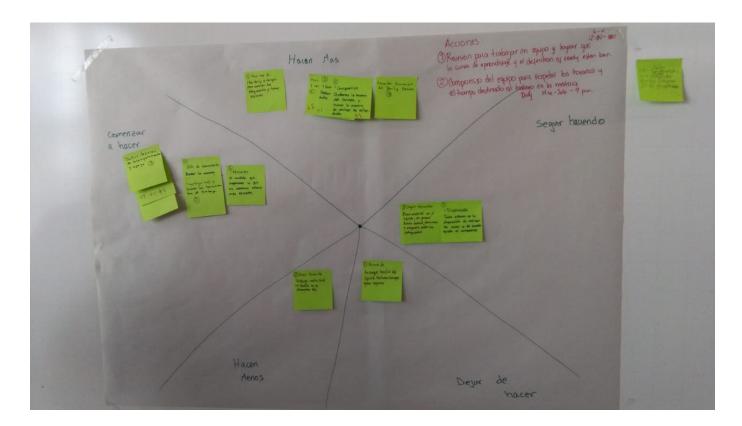

Compromisos

Reuniòn para trabajar en equipo y lograr que la curva de aprendizaje y el definition of ready estèn bien.

Compromiso del equipo para respetar los horarios y el tiempo destinado al proyecto.

Acciones

Reuniòn el dìa domingo 14 de octubre para poner a punto los proyectos en las diferentes màquinas.


Reuniòn de lunes a viernes de 12m a 1pm.

En caso de faltar o llegar tarde sin explicación se agregarán puntos negativos. Al final del sprint, el que tenga más puntos negativos invita a los demás a almorzar.

Estimados por persona

Yamid Ramirez: 10 horas por h.u. Andres Vargas: 14 horas por h.u. Michel Lopez: 14 Horas por h.u. Adriana Bonilla: 12 horas hu

Burndown chart

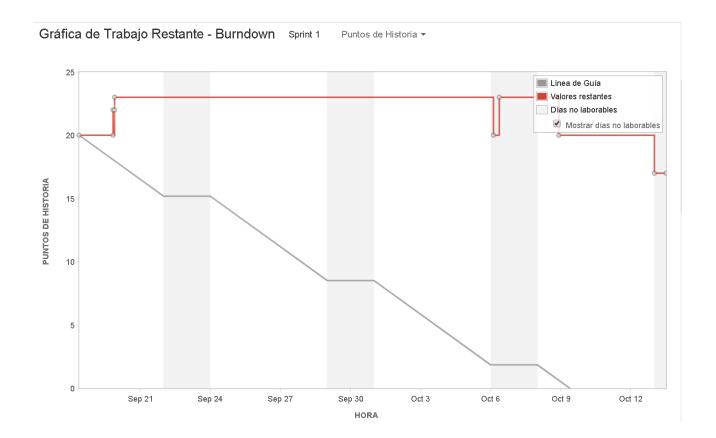

Sprint 2 Sprint 3

Registro de pruebas unitarias

Id. Historia de Usuario	Nombre HU	Revisión set de pruebas	Rama de TDD (si aplica)
EQ-16	Agregar comentario en revisión de calidad	Pendiente revisión	https://github.com/apbonillab/ResourcesAdminBackend.g it
